

NIEUWSFLITS NIEUW ZAAILAND


Hierbij ontvangt u de 23^e nieuwsflits van project Nieuw Zaailand. Hiermee informeren wij u over wezenlijke zaken rond de bouw in de komende twee weken.

Werkzaamheden parkeergarage

De BLC vordert snel met het heien van de laatste palen en is eind deze week klaar met het grote heiwerk. Dit betekent voor de mensen die overlast hebben gehad van het heien, dat het ergste lawaai en trillingen voorbij zijn. Wij waarderen de inzet en het geduld van mensen die de overlast van dichtbij ervaren.

Naast de laatste heipalen gaat de BLC verder met het betonwerk aan de fundering van de garage; de poeren en de kolommen. Ook worden de wanden zichtbaar van de trappenhuizen tussen de nieuwe winkelwand en het Fries Museum. Het aanleggen van de nieuwe drainage en de bestrating op de -2 verdieping van de parkeergarage ligt op schema en gaat verder. Vanaf deze week neemt de BLC ook de 2^e torenkraan in gebruik aan de kant van het Paleis van Justitie.

De toekomstige in- en uitrit in het Zaailand wordt verder uitgegraven. Ook plaatst de BLC daar de 2^e laag stempelramen (zie plaatje); balken die tussen de wanden worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de damwanden recht blijven staan en niet door de grote druk naar binnen vallen.

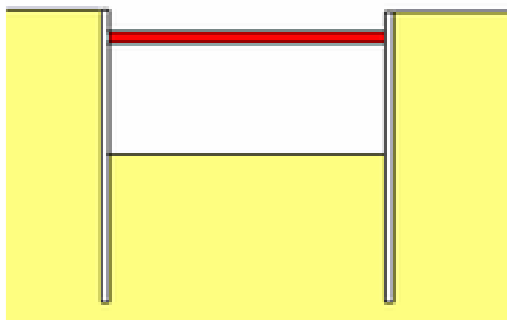

(bron: Wikipedia)

Werkzaamheden Winkelcentrum Zaailand

Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans is volop bezig met het metselwerk aan de gevel Wilhelminaplein en het Zaailand. Langs het Ruiterskwartier en het Wilhelminaplein is de bouwcombinatie aan het voegen. In de appartementen is de bouwcombinatie bezig met het stucwerk en tegelwerk. De steiger langs het Ruiterskwartier wordt eind deze week gefaseerd weggehaald. Daarna zet de bouwcombinatie daar de 1^e nieuwe winkelpuien erin.

Start uitbreiding Winkelcentrum Zaailand op Mercuriusplein

Bouwcombinatie Van Wijnen-Heijmans heeft inmiddels de hekken rond het Mercuriusplein neergezet. De voorbereidende werkzaamheden voor het inbrengen van de damwanden lopen. Archeologen hebben het onderzoek naar de oude stadsmuren ter plekke bijna klaar. Op korte termijn begint de bouwcombinatie met het inbrengen van de damwanden. Deze worden, net als bij de parkeergarage, zover mogelijk in de grond geduwd. Als het nodig is, trilt de bouwcombinatie het laatste stuk met een trilblok in de grond.

Zoals in de vorige nieuwsflits stond, monitoren wij de trillingen constant. Als u trillingen voelt in uw gebouw door de werkzaamheden, kunt u ervan uitgaan dat dit binnen de grenswaarden is en dat die trillingen geen schade veroorzaken aan de gebouwen. Als u hierover nog vragen heeft, belt u met de omgevingsmanager.

Bouwverkeer op Willemskade

De vervanging van de klinkers door betonplaten in de Willemskade is vorige week begonnen. Door de vorst is dit een aantal keer uitgesteld. De werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond.

Kijk ook op www.nieuwzaailand.nl voor de meest actuele informatie. De volgende nieuwsflits verschijnt rond 23 maart.

Omgevingsmanager, dhr. J. Stieber: 058 – 233 8075
Projectsecretariaat, mevr. H. Seepma: 058 – 233 8779
e-mail: info@nieuwzaailand.nl
www.nieuwzaailand.nl

